


Resumo 05.E - Sprint 292

Durante a sprint 292 a Equipa E trabalhou nos seguintes temas:

- Dívida Técnica:
 - Testes unitários e de integração nas escalas;
 - Tipagem de formulários de escalas;
- Maternidade:
 - Correção de bugs;
 - Finalização do módulo Nascimento;
- IAM - Tarefas de colaboradores.
- Correção de vulnerabilidades dos diferentes módulos.

Métricas de Sprint:

Say-Do

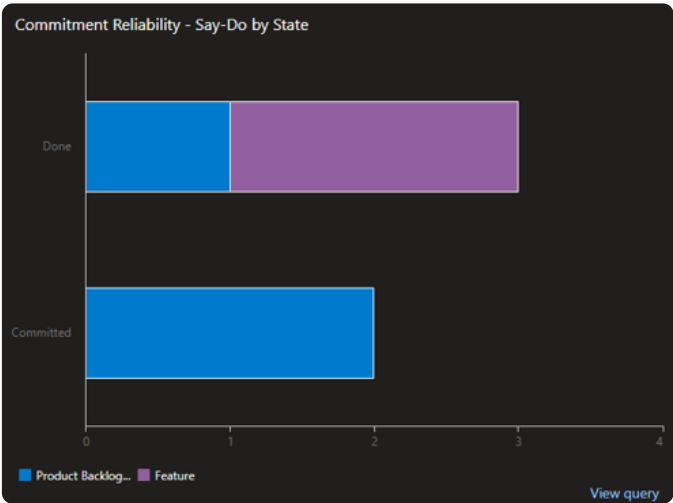


O produto passou à equipa **cinco elementos** com a marca *BS GoForward Passagem RA*:

Identificação	Estado	Nota
Product Backlog Item 164966 : CUF API Gestão incremental de grupos: endpoints de adicionar e remover	Done	
Feature 164692 : Módulo Nascimento Componente Nascimento (registo)	Done	

Product Backlog Item 164967 : CUF API Disponibilidade de colaboradores por serviço segue os grupos ativos do utilizador	Committed	Pendente alinhamento com Pedro Ferreira e Hugo Silva
Product Backlog Item 164968 : CUF API Alterações de colaboradores e de grupos de utilizador refletem-se nas listas sem esperar pela expiração da cache	Committed	Pendente alinhamento com Pedro Ferreira e Hugo Silva
Feature 164518 : Modulo Maternidade Criação do Recem-Nascido	Done	A parte da aplicação já tinha sido feita na 291 mas estava em falta a parte da integração.


Fecharam três dos cinco, pelo que o Say-Do da sprint é de **60%**.

Sprint Burndown

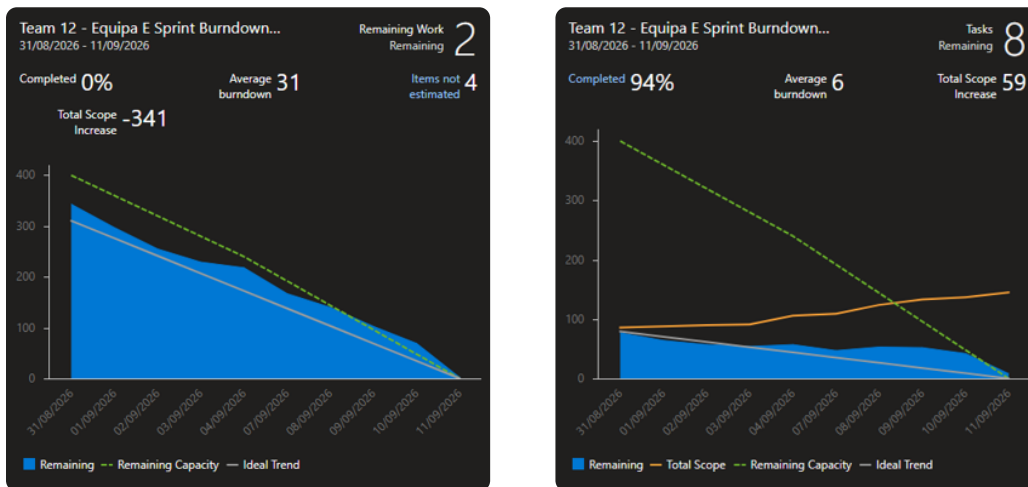


Os dois *Sprint Burndown* medem o trabalho técnico, não o valor entregue: à esquerda as horas que faltam, à direita a contagem de tarefas. Fecharam 137 das 145 tarefas (94%) e as horas restantes desceram de 338h para 2h, com o maior movimento no último dia: 42 tarefas e 67h a 11/09. A linha do âmbito total sobe de 86 para 145 tarefas — é a decomposição dos itens que entraram na sprint, por antecipação.

Scope Creep

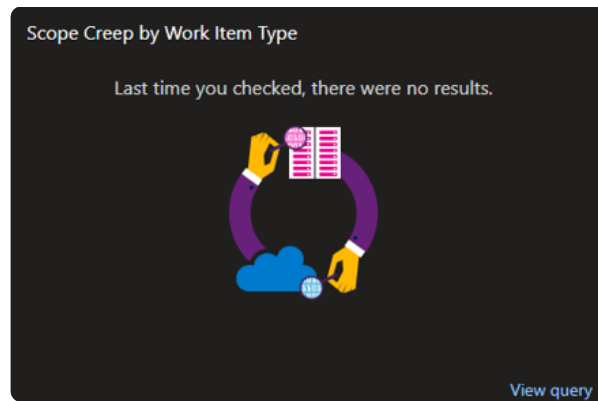

O *Scope Creep* está vazio e está correto — nenhuma Feature foi passada à equipa com a sprint a decorrer, e nada saiu do âmbito para dar lugar a outra coisa. Vazio não significa que não entrou trabalho: entraram 29 itens, mas por decisão da equipa e não por imposição de fora, por antecipação de trabalho.

Bugs During Sprint

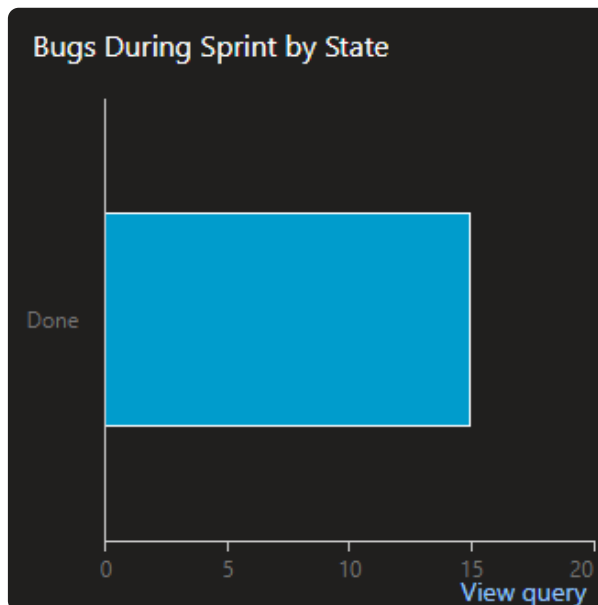


O *Bugs During Sprint* mostra 15 defeitos abertos nesta sprint, todos em *Done*:

- [Bug_166072](#): Birth | Birth Record | Form must be opened from a sidebar
- [Bug_166100](#): Maternity | Design corrections
- [Bug_166103](#): Maternity | The birth view form does not save data if the pregnancy has already concluded
- [Bug_166124](#): Corrigir pipeline de PR para release e validar comportamento em master
- [Bug_166216](#): Maternidade Module | No log visibility for RunScripts in ArgoCD

- [Bug_166356](#): Escala Downton | Não é possível guardar o formulário se tivermos seleccionadas mais de 3 checkboxes
- [Bug_166504](#): Escalas/Avaliações | Score ID pode não estar preenchido
- [Bug_166530](#): [Maternidade] Formulário/Componente de Parto - quando seleccionada a opção Distócico | Cesariana no Campo Parto são escondidas opções do campo Estado do Péríneo
- [Bug_166534](#): [Maternidade] Formulário/Componente de Parto - Distócico | Cesariana: Descrição não conforme
- [Bug_166557](#): [Modulo Maternidade] Formulário/Componente de Registo de Nascimento - na secção de Cordão Umbilical falta a descrição «Umbilical» no campo Localização e Tempo de Clampagem do Cordão
- [Bug_166558](#): [Modulo Maternidade] Formulário/Componente de Registo de Nascimento - na Auditoria fala a designação «por»
- [Bug_166948](#): [Maternity] Birth Registration form/component - "Pediatrician" field must list users with a doctor profile and the paediatrics specialty
- [Bug_166965](#): ESCALAS | Erro na consola (400) ao guardar a escala em branco (Formulário de Avaliação)
- [Bug_166981](#): Escalas | Não aparece o * no campo Data que é obrigatório
- [Bug_167039](#): Escalas | escala Aldrete | Não dá para guardar como "Em Aberto"

Hotfixes

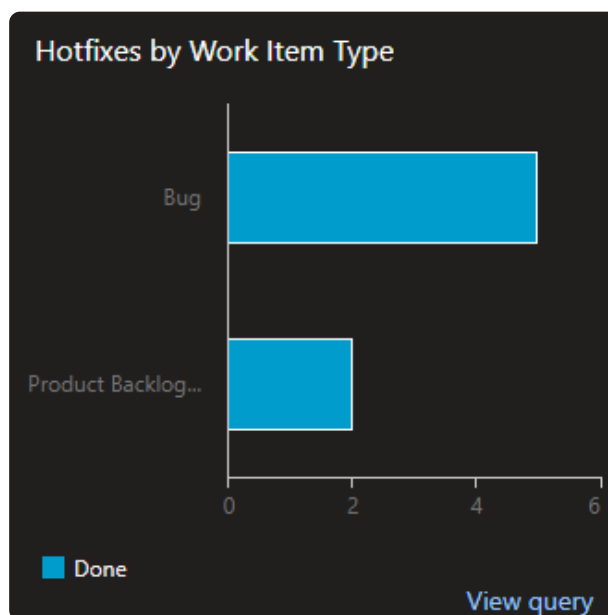

Hotfixes conta os sete itens com a tag, mas as intervenções para a versão anterior foram quatro — a primeira agrupou quatro itens.

- Hotfix 1
 - [Bug 166072](#): Birth | Birth Record | Form must be opened from a sidebar
 - [Bug 166103](#): Maternity | The birth view form does not save data if the pregnancy has already concluded
 - [Product Backlog Item 164983](#): 7. Birth | Birth Record | Audit data at the end of the Birth component
 - [Product Backlog Item 164985](#): 8. Birth | Birth Record | Non-editable fields: THOM communication fields and Birth order
- Hotfix 2
 - [Bug 166100](#): Maternity | Design corrections
- Hotfix 3
 - [Bug 166216](#): Maternidade Module | No log visibility for RunScripts in ArgoCD
- Hotfix 4
 - [Bug 166557](#): [Modulo Maternidade] Formulário/Componente de Registo de Nascimento - na secção de Cordão Umbilical falta a descrição «Umbilical» no campo Localização e Tempo de Clampagem do Cordão

Tabela de resumo do trabalho realizado na sprint

Story Points	Total
Planeados no arranque (31/08)	117
Acrescentados durante a sprint	+77
Âmbito final	194
Cumpridos	183

Os 183 SP cumpridos são 94% dos 194 do âmbito final e cobrem toda a linha de base de 117 planeados no arranque, à exceção dos 8 SP do PBI 164967 — os restantes 77 SP são os que entraram já com a sprint a decorrer, por antecipação de trabalho.
